

Manual de Procedimientos y Uso

Sistema Control de Proyectos — Dashboard Gerencial de Obra · Norton

Versión: 1.0 · Fecha: 10 de septiembre de 2026 · Cubre: Fases 0, 1 y 2a

Elaborado por: Ing. José E. Palomares — Consultor Sistemas de Información

Módulo dentro de: CRM Comercial Norton

1. Introducción

El **Sistema Control de Proyectos** es un módulo del CRM que reemplaza el control de obra que hoy se lleva en hojas de Excel. Permite hacer seguimiento a cada proyecto en ejecución —avance físico, avance financiero, facturación, costos y cumplimiento de cronograma— con la **Curva S** como herramienta central de comparación entre lo planeado y lo ejecutado.

El objetivo de fondo es que la **Gerencia General** tome decisiones rápidas sin depender de que cada gerente de proyecto arme manualmente un Excel para cada comité de obra, y que toda la información quede en un solo lugar, trazable y siempre actualizada.

¿Por qué “EN CONSTRUCCIÓN”? El sistema se desarrolla por fases. Este manual crece con él: cada vez que se libera una fase, se documenta aquí. Lo marcamos en **naranja** en el menú para distinguirlo del módulo **Proyectos** actual, que sigue funcionando igual y no se toca.

2. Objetivos del sistema

Centralizar el control de todos los proyectos en ejecución en un solo tablero, sin Excel dispersos.

Comparar lo planeado contra lo real (Curva S física y financiera) en cualquier momento.

Controlar presupuesto, costos, facturación y cartera por proyecto y por partida (WBS).

Alertar a tiempo sobre desviaciones de avance, margen o flujo de caja.

Evitar doble digitación tomando la línea base desde la oferta ganada.

Estandarizar el reporte de comités de obra con un formato único de marca Norton.

3. Alcance y a quién va dirigido

Rol	Qué hace en el sistema
Gerencia General	Ve el portafolio completo, todos los indicadores y exporta reportes.
Gerente / Responsable de proyecto	Carga y ve la información de sus proyectos asignados.
Área administrativa / financiera	Carga facturación y cartera; ve el avance físico en solo lectura.
Comercial	Solo lectura del estado de los proyectos derivados de sus ofertas ganadas.


4. Glosario de términos

Término	Significado
Curva S	Gráfico acumulado en el tiempo (forma de “S”) que compara el avance planeado contra el real, físico o financiero.
Partida / WBS	Cada ítem o capítulo en que se divide el presupuesto y el alcance (ej. cimentación, estructura, pintura). Estructura jerárquica: capítulo > partida > sub-partida.
Línea base	Presupuesto y cronograma aprobados inicialmente, contra los que se mide toda desviación.
AIU	Administración, Imprevistos y Utilidad: componentes del precio de una oferta de construcción.
Acta de avance de obra	Documento que certifica el avance físico de un período y sustenta la facturación al cliente.
Otrosí	Modificación contractual formal (ampliación de plazo o alcance) sobre un contrato firmado.
Corte	Fecha (semanal o mensual) en la que se registra el avance. Cada corte se guarda como histórico y no se sobrescribe.

5. Cómo entrar al sistema

Inicia sesión en el CRM. En el **menú lateral**, dentro del bloque naranja del sistema, encuentras dos opciones: este **Manual** (primera opción) y **Control de Proyectos** (el módulo).

Figura 1. Menú lateral — el sistema aparece en naranja

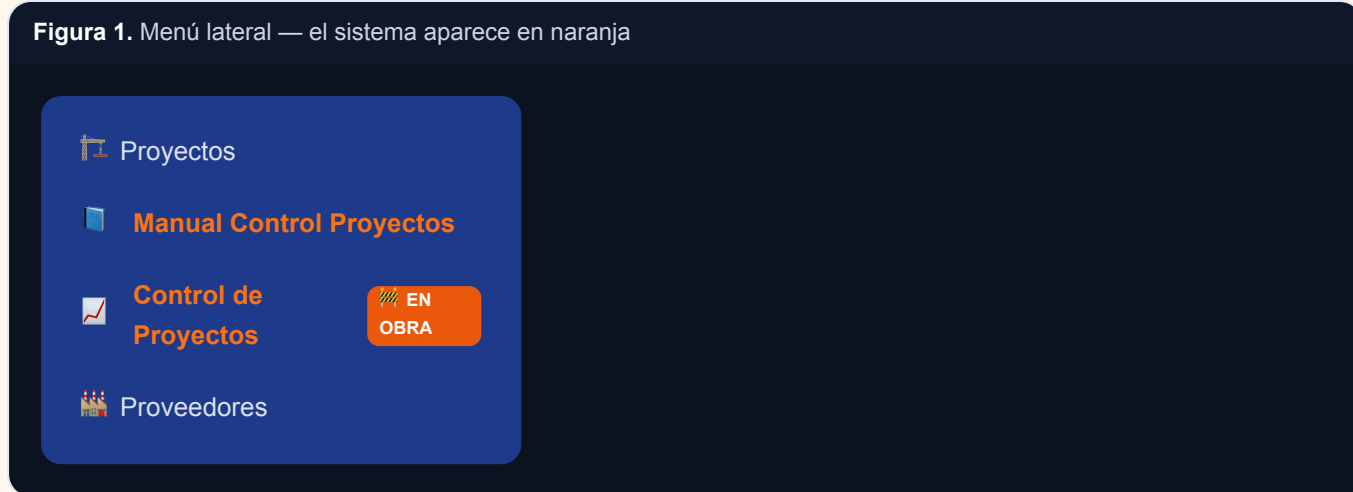

El color naranja distingue el sistema nuevo del módulo “Proyectos” tradicional.

6. Proceso 1 — Crear un Control de Proyecto

Registrar un proyecto para hacerle seguimiento. Este es el punto de partida.

- 1 Entra a  **Control de Proyectos** en el menú.
- 2 Pulsa **+ Nuevo Control** (botón naranja, arriba a la derecha).
- 3 El sistema asigna automáticamente el consecutivo **CTP-XXXX** y la fecha de registro.
- 4 Completa los datos base: **Nombre del proyecto**, **Cliente**, **Responsable/Gerente**, **Tipo de contrato**, **moneda** y **presupuesto / línea base**.
- 5 Indica las **fechas** (inicio plan, fin plan, inicio real) y la **frecuencia de corte** (Mensual o Semanal).
- 6 Elige la **Situación** (En Planeación, En Ejecución, etc.) y pulsa **Guardar**.

Figura 2. Ficha del Control de Proyecto (datos base)

Nuevo Control de Proyecto

Nro Control *	Fecha Registro	Código Proyecto
CTP-0001	10/09/2026	16-16

 Vincular Oferta (opcional — trae cliente, proyecto, moneda y presupuesto)
OF-0007 · NORTON · Edificio Industrial CLE 16-16

Nombre del Proyecto *	Cliente *	Presupuesto / Línea Base
Edificio Industrial CLE 16-16	NORTON EDIFICIOS ...	\$ 2.670.127.485

7. Proceso 2 — Vincular una Oferta ganada (auto-relleno)

Para no volver a teclear datos que ya existen, el sistema puede tomar la información desde una oferta del módulo **Seguimiento Oferta**.

- 1 Dentro de la ficha, en  **Vincular Oferta**, abre la lista y elige la oferta correspondiente.
- 2 El sistema rellena automáticamente **Cliente**, **Nombre del proyecto**, **Moneda** y **Presupuesto (línea base)**.
- 3 Revisa y ajusta lo que necesites; luego **Guardar**.

Ventaja: la línea base del proyecto queda idéntica a la oferta ganada, sin errores de transcripción. Es el flujo **Oportunidad** → **Oferta** → **Proyecto** que pide la especificación.

8. Proceso 3 — Cargar el WBS / Presupuesto (importar Excel)

El **WBS** (Work Breakdown Structure) es el desglose del presupuesto por partidas jerárquicas. Se puede **importar directamente desde el Excel de control de obra** o capturar a mano.

A) Importar desde Excel

- 1 En la sección  **Partidas (WBS)** de la ficha, pulsa  **Importar Excel**.
- 2 Elige tu archivo de control (ej. `5396-CLE16-Control.xlsx`).
- 3 El sistema busca la tabla **Código / ITEM** y muestra cuántas partidas leyó y el presupuesto total. Confirma para cargarlas.
- 4 Las partidas aparecen con su **jerarquía** (1 · 1.1 · 1.1.1), **unidad** (glb, Kg, Ton), **cantidad**, **valor unitario**, **total** y **peso %**.
- 5 Revisa, ajusta lo que haga falta y pulsa **Guardar**.

B) Capturar o ajustar a mano

- **+ Partida** agrega una fila nueva. El código define el nivel: `1` capítulo, `1.1` partida, `1.1.1` sub-partida.
- Si escribes **cantidad** y **valor unitario**, el **total** se calcula solo.
- El **peso %** y el **total** (suma de las partidas “hoja”, sin duplicar los capítulos padre) se recalculan automáticamente.

Figura 3. Partidas (WBS) importadas del Excel de obra

Código	ITEM	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total	Peso %
1	Indirectos				\$150.533.985	—
1.1	Pólizas talleres	glb	6	\$3.049.297	\$18.295.782	0.7%
1.1.1	Buen manejo de anticipo	glb	1	\$3.512.790	\$3.512.790	0.1%
1.2	Impuestos	glb	1	\$48.300.865	\$48.300.865	1.8%
TOTAL (suma de hojas)					\$2.670.127.485	

Importante: el total suma solo las partidas “hoja” (las de último nivel) para no contar dos veces los capítulos que las agrupan. Así el presupuesto cuadra con el Excel original.

9. Bitácora de seguimiento

Cada proyecto tiene una **bitácora** donde se registran notas y cambios de situación con fecha y usuario. Sirve para dejar el historial de decisiones y novedades del proyecto (retrasos, acuerdos, hitos). Se usa igual que en los demás módulos del CRM.

10. Estado del desarrollo (hoja de ruta)

Este sistema se libera por fases. Estado a la fecha de este manual:

✅ Fase 0

Esqueleto del módulo y acceso desde el menú.

✅ Fase 1

Ficha del proyecto + datos base + vínculo a oferta.

✅ Fase 2a

WBS / partidas + presupuesto e importación de Excel.

🕒 Fase 2b

Capas Proyectado/Real y eje semanal → mensual.

🕒 Fase 3–4

Cortes de avance + Curva S (3 curvas) + KPIs.

🕒 Fase 5–6

Portafolio, semáforos, cartera, alertas y exportación.

Cada fase que se libere se documentará en la siguiente versión de este manual, con sus procesos paso a paso y capturas del sistema real.
